Info-Travaux : Parc de la Haute Chaudière

Date: du 19 juillet au 25 juillet 2026

Travaux en semaine :

- Terrassement : Route P1 P2 P3 P4, Branche A B,
  Pad : T25 - T26 - T27 - T28 - T29 - T30 - T07 - T03 -T09 Route : T25, T26, T27, T28, T29 et T30
- Dynamitage : Short Cut 4, Short Cut 3 et pad T11 T09

Règles de sécurité :

- Respecter les limites de vitesse en tout temps.
- Prêter attention aux zones où du travail est en cours.
- Garder une distance de sécurité avec les équipements.
- Respecter la signalisation et les agents présents sur le site.
- Ne pas se déplacer dans une zone de travail sans avertir au préalable le contremaître.
- Avoir un contact bidirectionnel positif avec les opérateurs des équipements.

Procédure de dynamitage :

- Signal sonore : 12 petits coups d'avertisseur à une seconde d'intervalle
- Pause de 30 secondes
- Mise à feu
- 1 grand coup de 15 secondes d'avertisseur
- Confirmation par le boutefeu que le sautage a été initié
- Libération du périmètre d'exclusion (zone de tir)

Contact :

- CA-quebeceolien@edf-re.com

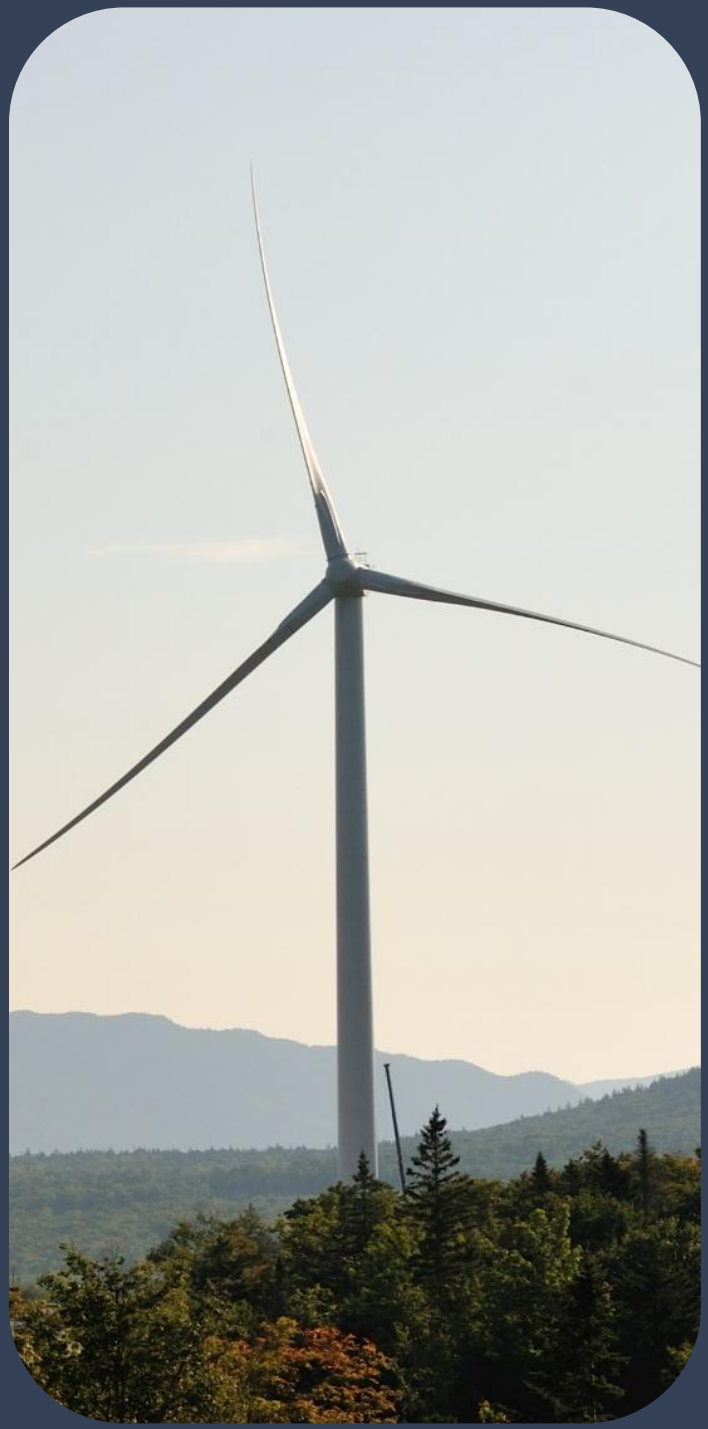

borea

HAUTE-CHAUDIÈRE
parc éolien

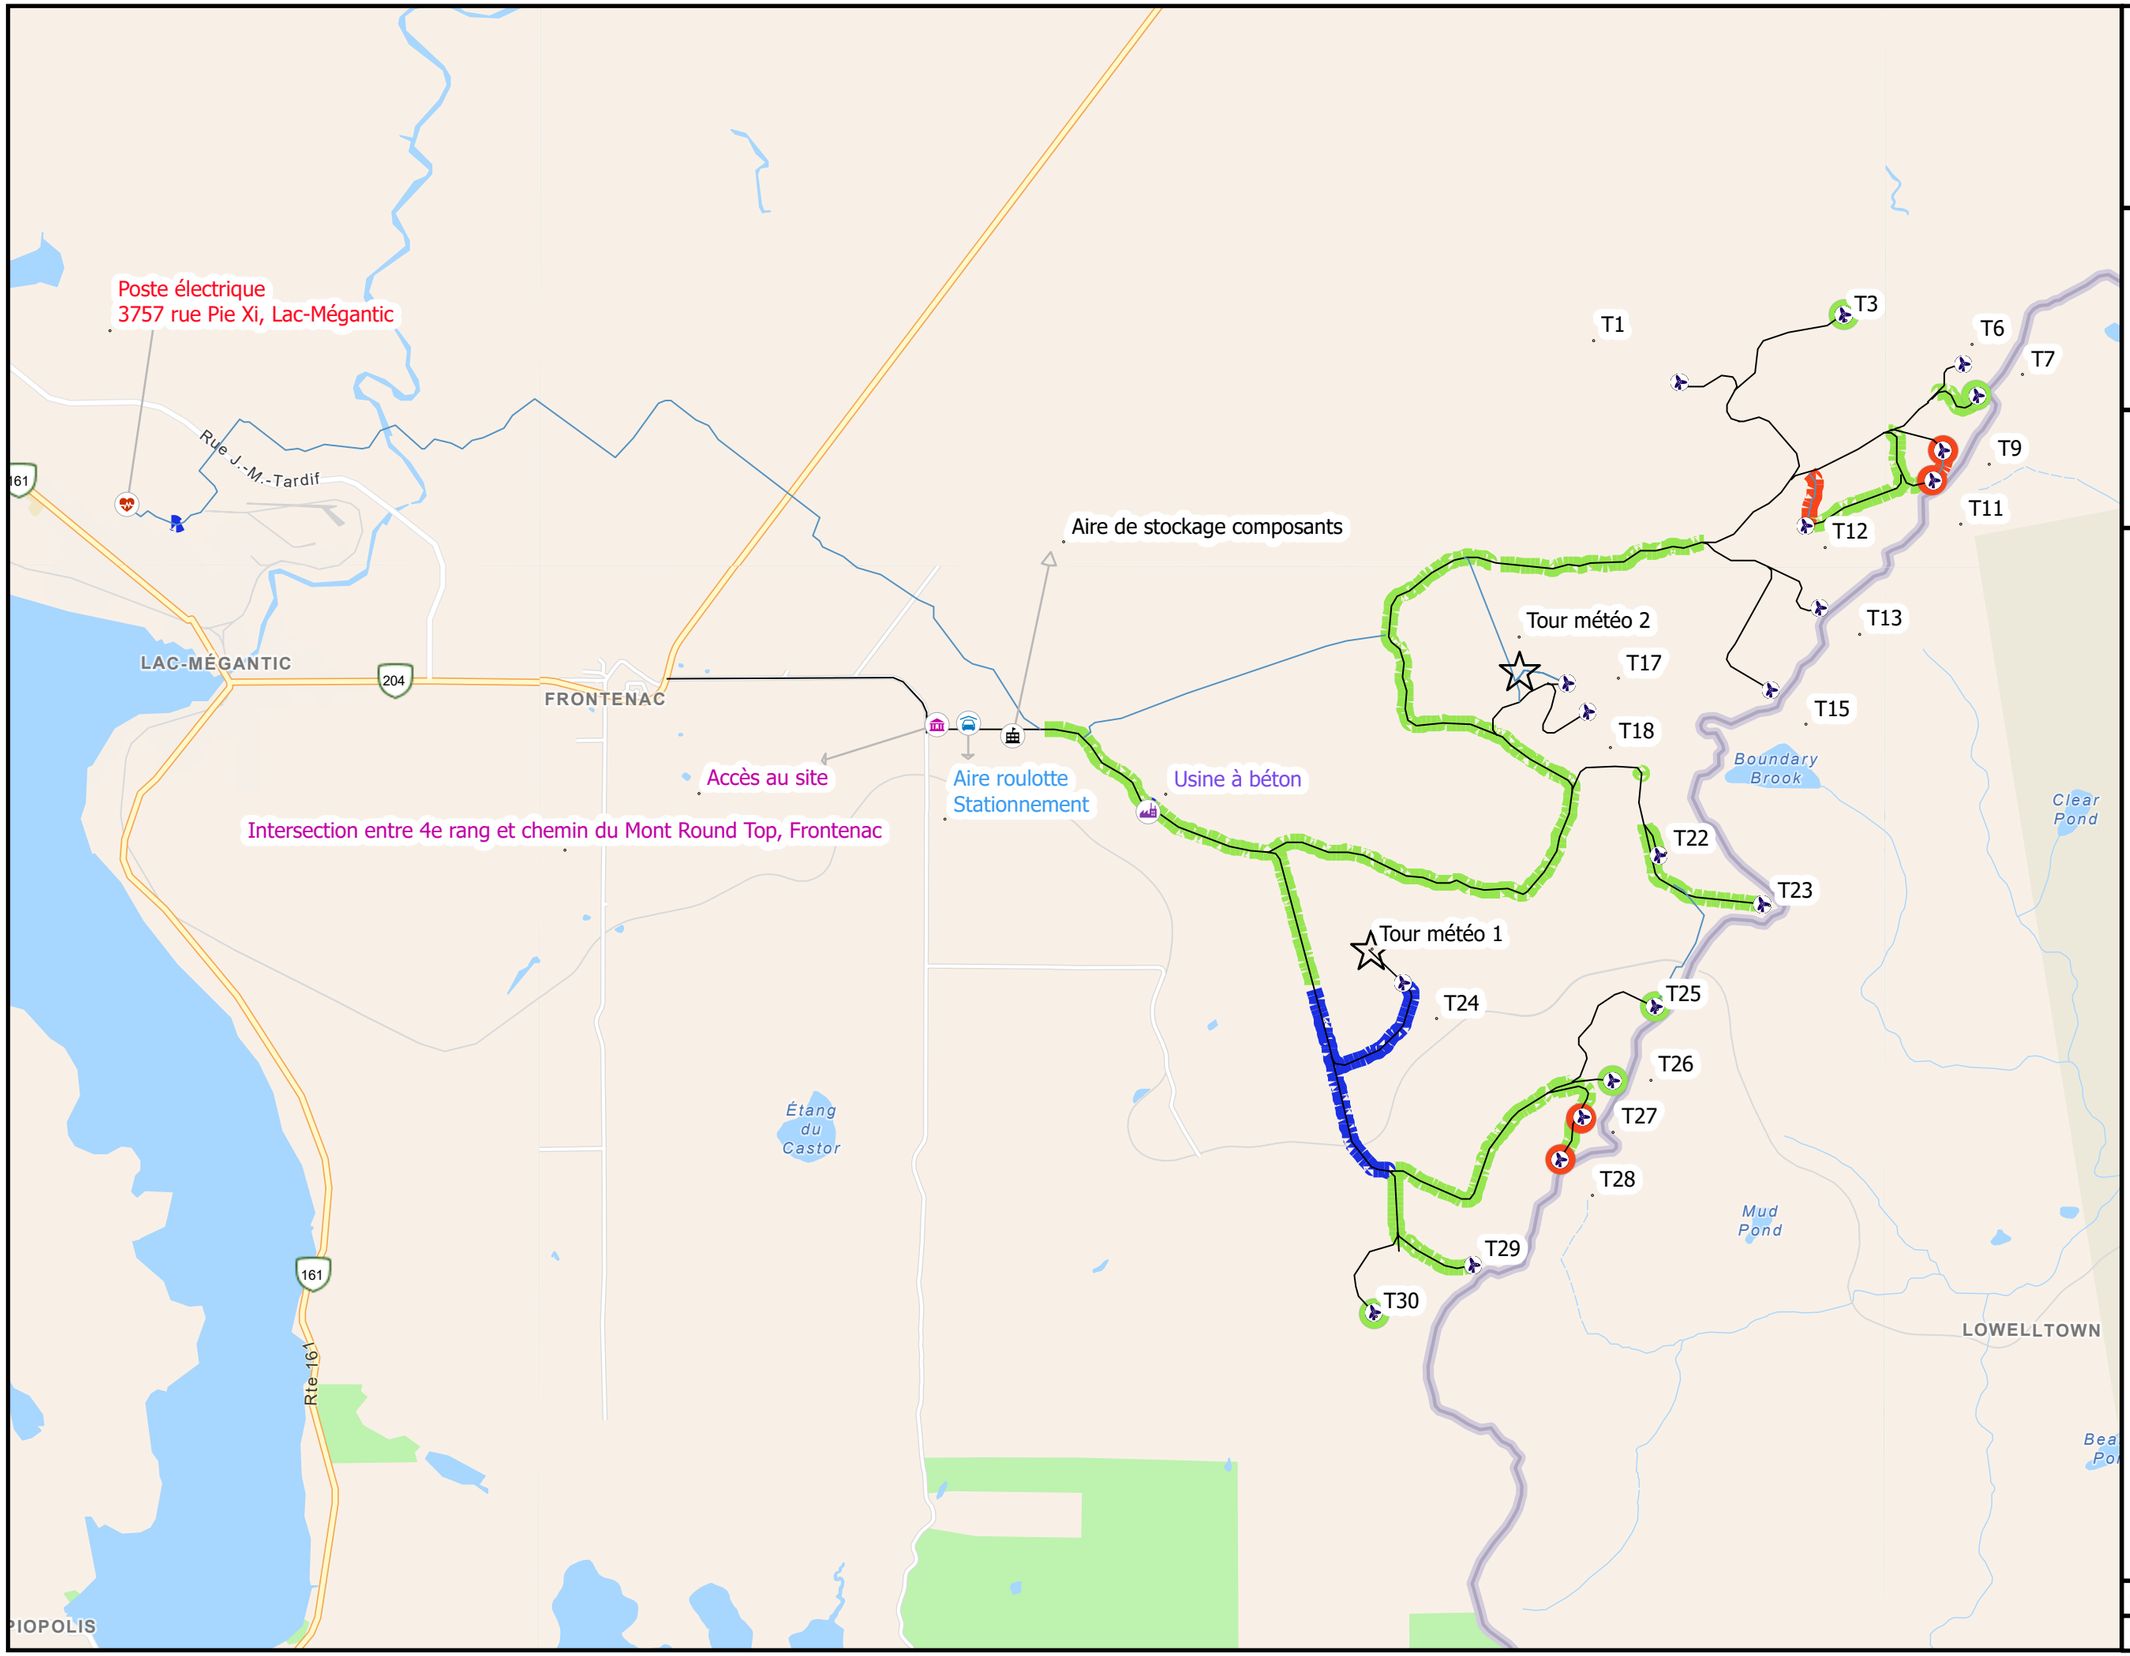

borea

HAUTE-CHAUDIÈRE
parc éolien

PROJET HAUTE-CHAUDIÈRE

LÉGENDE

- Turbine
- Réseau Collecteur
- Chemin d'accès
- Déboisement
- Dynamitage
- Terrassement
- Fondations
- Réseau Collecteur
- Montage
- Autres

Date : 7/16/2026	Préparé par : SB
Ref. : HCH_Info-Travaux	Rev. : 01
