Info-Travaux : Parc de la Haute Chaudière

Date: du 25 octobre au 31 octobre 2026

Travaux en semaine :

- Terrassement : Route P3 P4, Pads T3 T22
- Réception de composants d'éolienne : T22 T24 T25 T26 T27 T29 T30
- Montage : T1 T6 T7 T15 T25 T26 T29 T30
- Réseau collecteur : Excavations de tranchées de câbles BJ148 @ L14S3, L14S3 @ BJ149
  Installation de câbles: BJ147 @ BJ148, BJ148 @ BJ149, FO: Poste @ FOR4
  Remblai de tranchées de câbles : BJ127 @ BJ148, BJ148 @ L14S3, L14S3 @ BJ149
- Autre : Sous-Station et O&M

Règles de sécurité :

- Respecter les limites de vitesse en tout temps.
- Prêter attention aux zones où du travail est en cours.
- Garder une distance de sécurité avec les équipements.
- Respecter la signalisation et les agents présents sur le site.
- Ne pas se déplacer dans une zone de travail sans avertir au préalable le contremaître.
- Avoir un contact bidirectionnel positif avec les opérateurs des équipements.

Procédure de dynamitage :

- Signal sonore : 12 petits coups d'avertisseur à une seconde d'intervalle
- Pause de 30 secondes
- Mise à feu
- 1 grand coup de 15 secondes d'avertisseur
- Confirmation par le boutefeu que le sautage a été initié
- Libération du périmètre d'exclusion (zone de tir)


Contact :

- CA-quebeceolien@edf-re.com



borea

HAUTE-CHAUDIÈRE
parc éolien

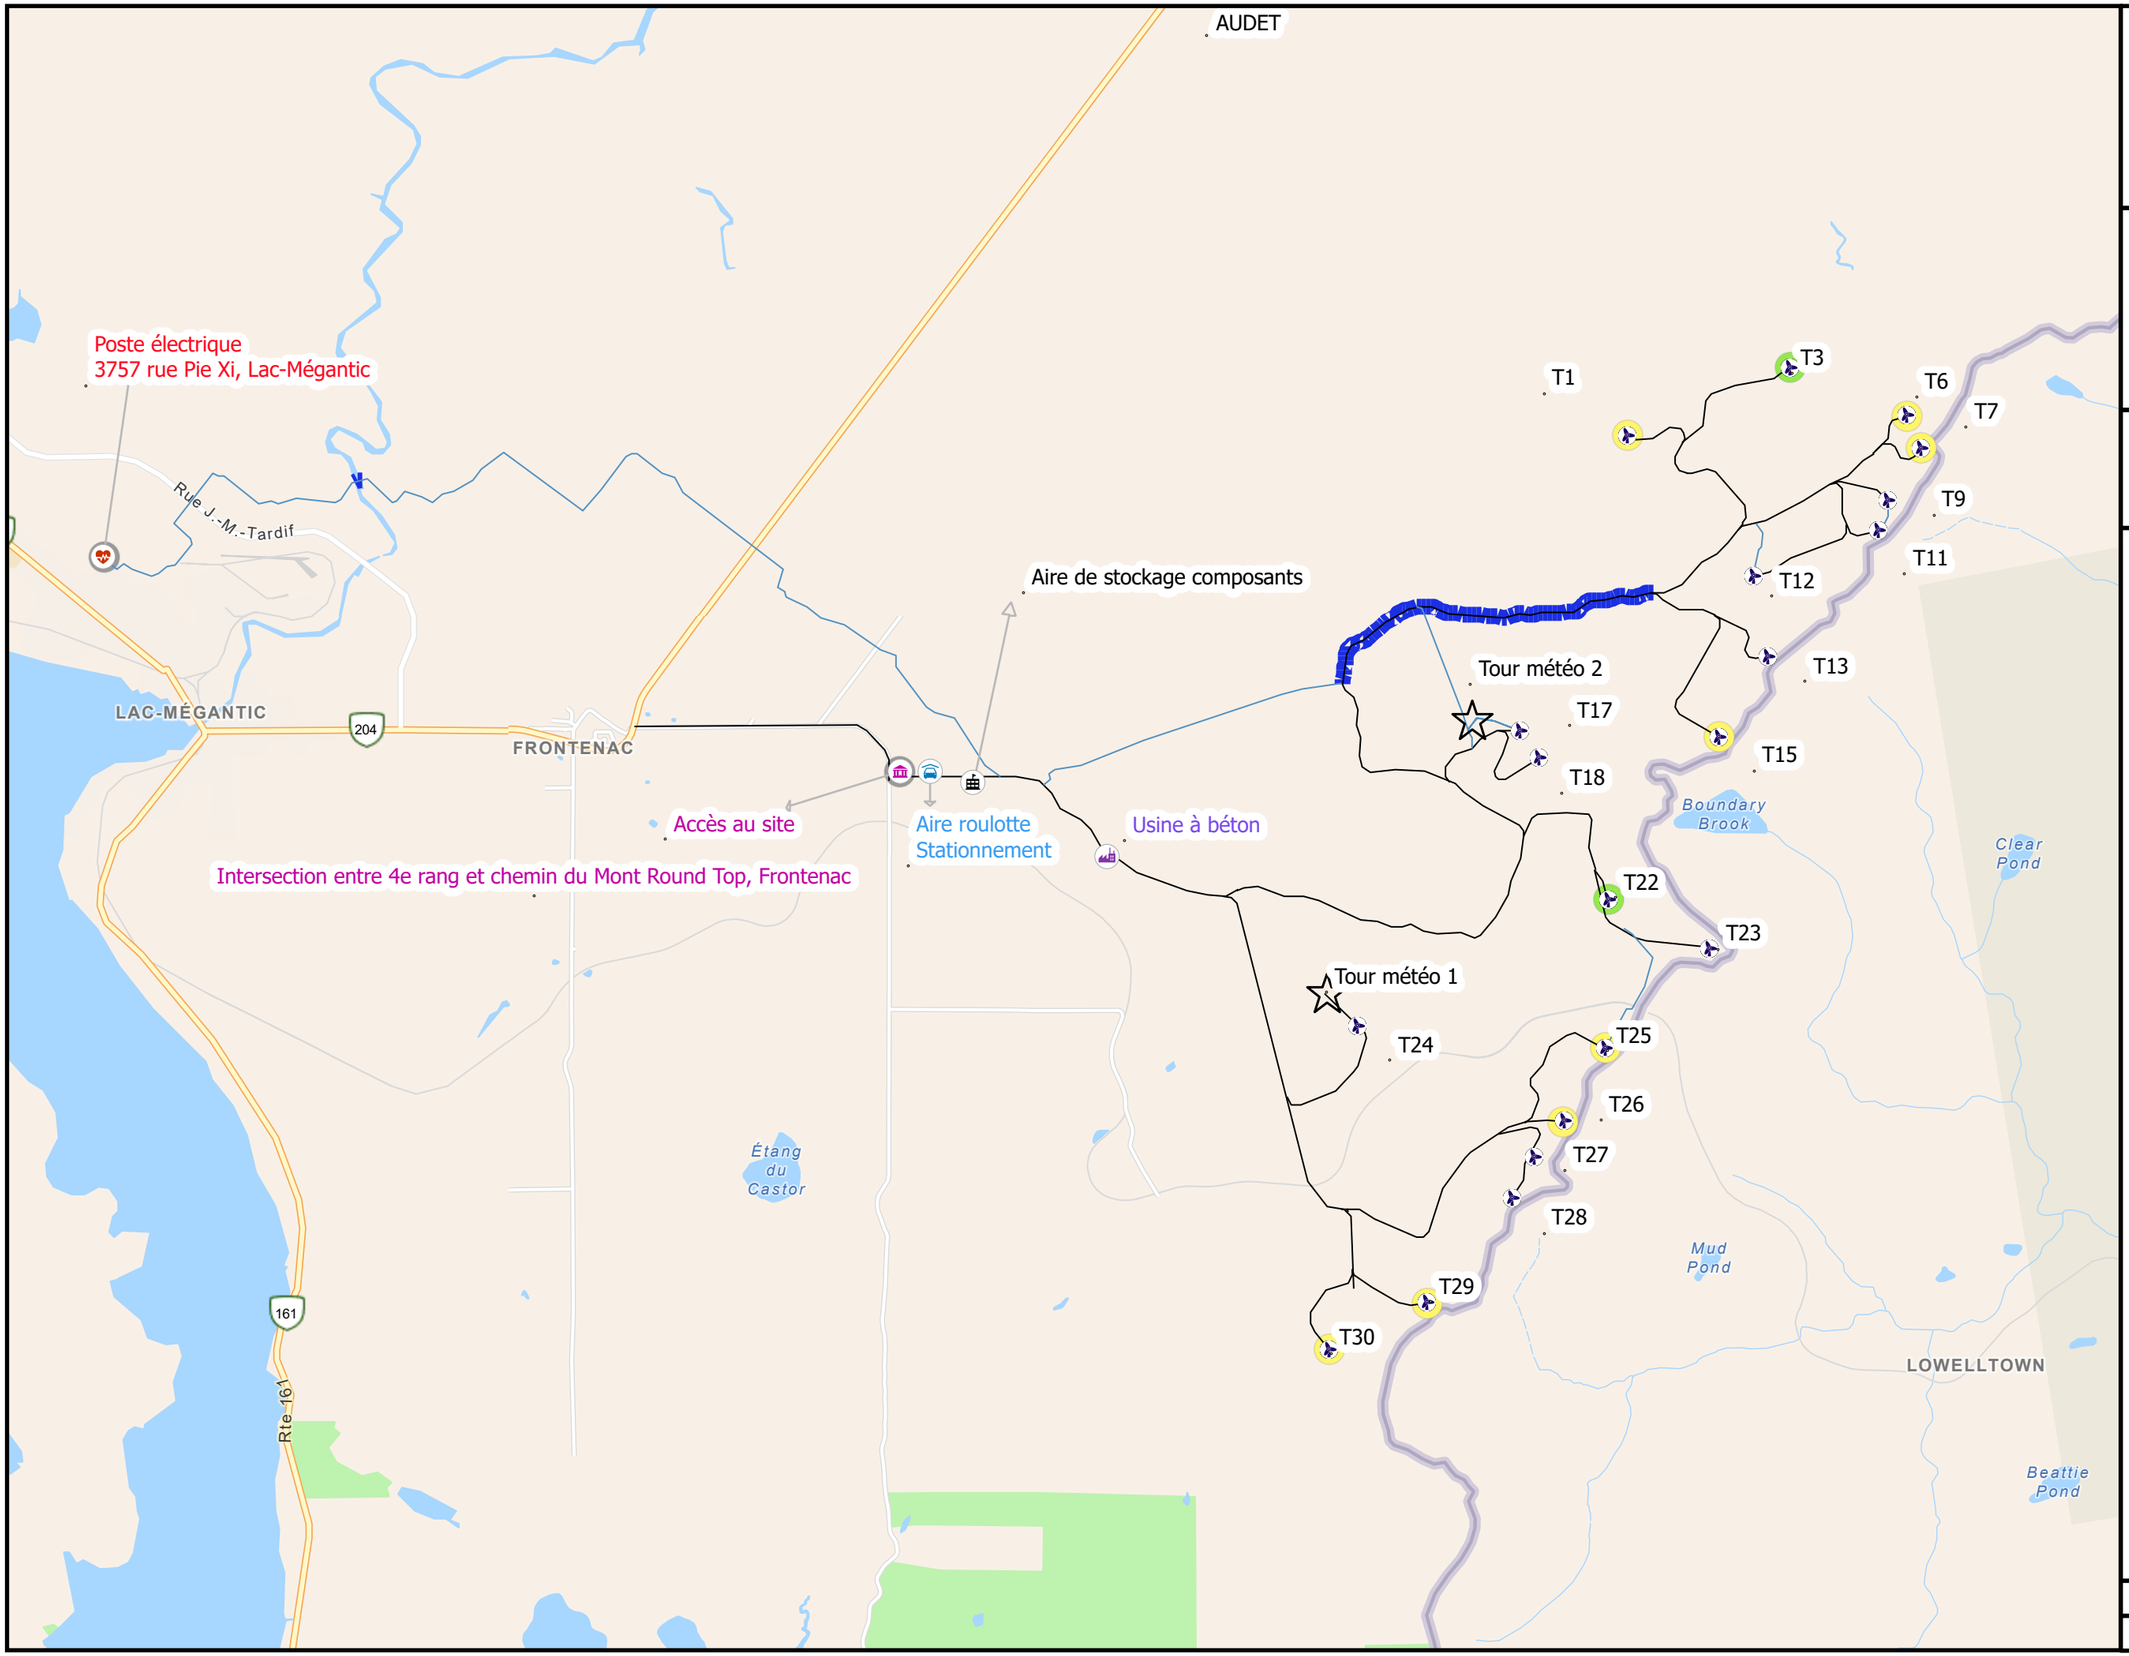

borea

HAUTE-CHAUDIÈRE
parc éolien

PROJET HAUTE-CHAUDIÈRE

LÉGENDE

- Turbine
- Réseau Collecteur
- Chemin d'accès
- Déboisement
- Dynamitage
- Terrassement
- Fondations
- Réseau Collecteur
- Montage
- Autres

Date : 10/23/2026	Préparé par : SB
Ref. : HCH_Info-Travaux	Rev. : 01
