Info-Travaux : Parc de la Haute Chaudière

Date: du 08 novembre au 14 novembre 2026

Travaux en semaine :

- Terrassement : Route P3 P4 P5
- Réception de composants d'éolienne : T1 T12 T13 T15 T22 T23 T24 T25 T27
- Montage : T6 T7 T9 T15 T26 T27 T28 T29 T30
- Remblai de fondation : T9 T17 (en attente de permis)
- Réseau collecteur : Excavations de tranchées de câbles Anodes FOR13/FOR14
  Installation de câbles HR: Poste @ FOR4, SCT 9, FOR 14, FOR 13
  Remblai de tranchées de câbles SCT 9, SCT 12, FOR 14 SCT 23, FOR 13
- Autre : Sous-Station et O&M

Règles de sécurité :

- Respecter les limites de vitesse en tout temps.
- Prêter attention aux zones où du travail est en cours.
- Garder une distance de sécurité avec les équipements.
- Respecter la signalisation et les agents présents sur le site.
- Ne pas se déplacer dans une zone de travail sans avertir au préalable le contremaître.
- Avoir un contact bidirectionnel positif avec les opérateurs des équipements.

Procédure de dynamitage :

- Signal sonore : 12 petits coups d'avertisseur à une seconde d'intervalle
- Pause de 30 secondes
- Mise à feu
- 1 grand coup de 15 secondes d'avertisseur
- Confirmation par le boutefeu que le sautage a été initié
- Libération du périmètre d'exclusion (zone de tir)


Contact :

- CA-quebeceolien@edf-re.com



borea

HAUTE-CHAUDIÈRE
parc éolien

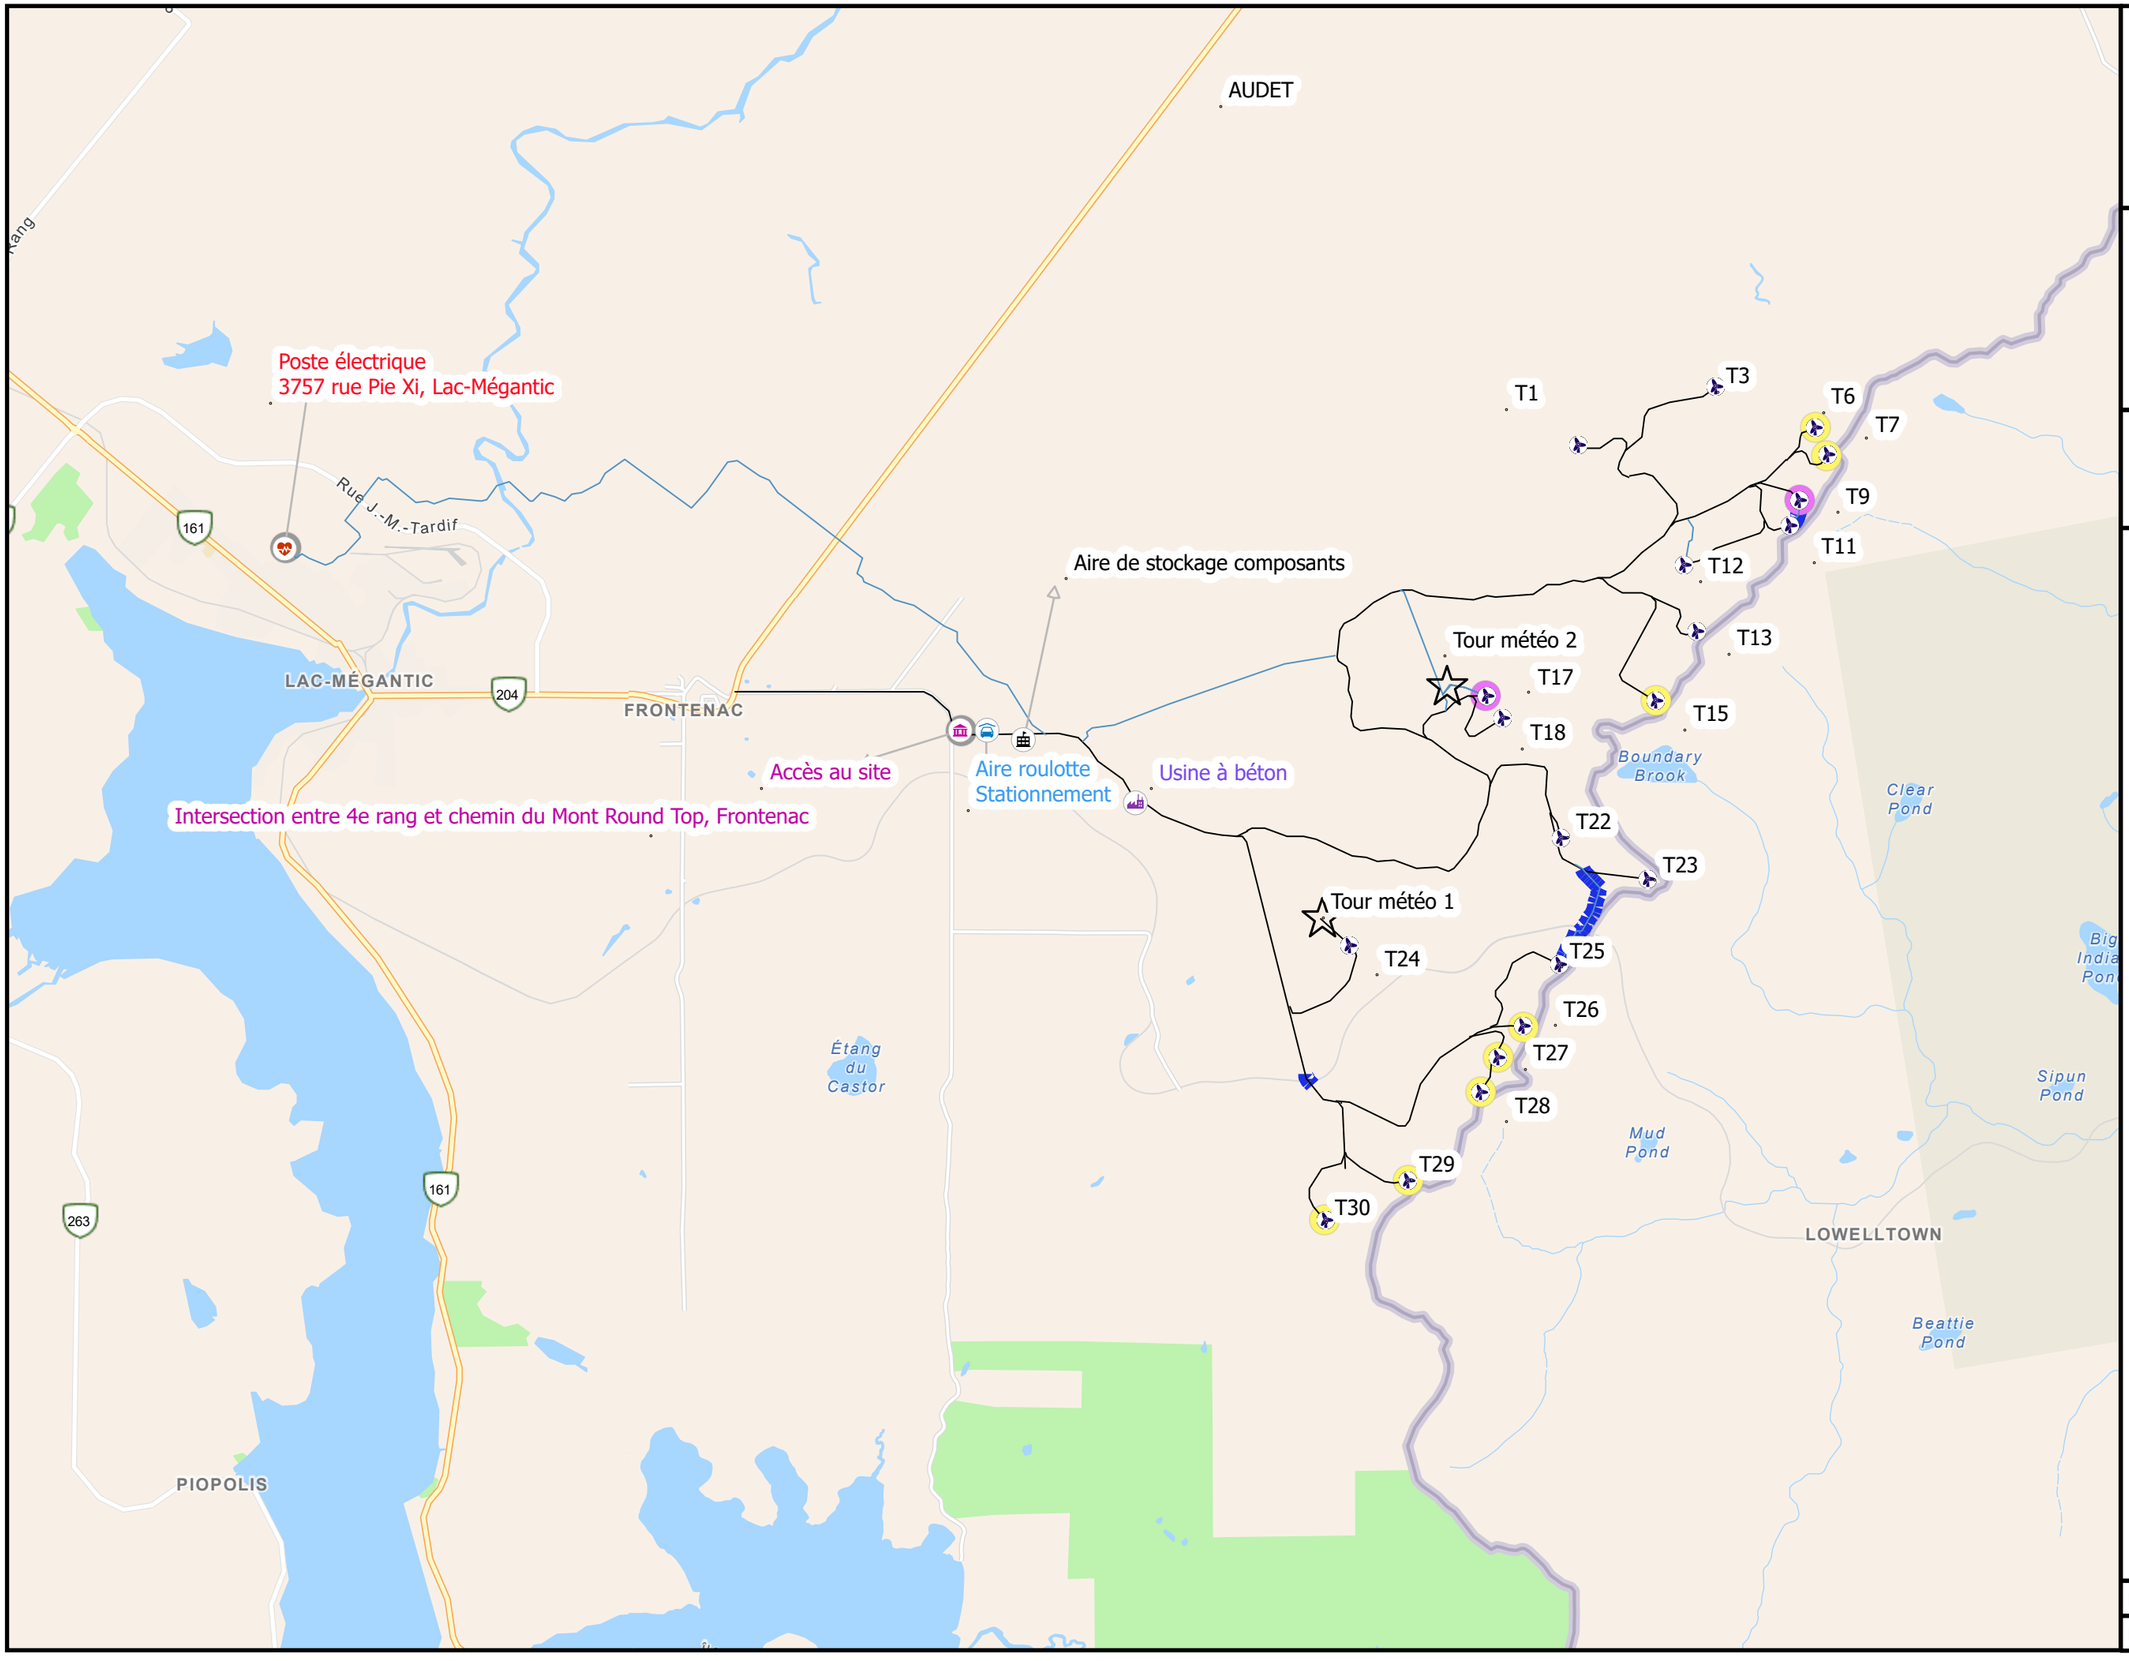

borea

HAUTE-CHAUDIÈRE
parc éolien

PROJET HAUTE-CHAUDIÈRE

LÉGENDE

- Turbine
- Réseau Collecteur
- Chemin d'accès
- Déboisement
- Dynamitage
- Terrassement
- Fondations
- Réseau Collecteur
- Montage
- Autres

Date : 11/6/2026	Préparé par : SB
Ref. : HCH_Info-Travaux	Rev. : 01
