Info-Travaux : Parc de la Haute Chaudière

Date: du 11 octobre au 17 octobre 2026

Travaux en semaine :

- Terrassement : Route P3 P4 P5 Branche C, D et E
- Fondation : T3 T17 T18
- Réception de composants d'éolienne : T23 T25 T27
- Montage : T1 T11 T12 T24 T25 T26 T27 T28 T29 T30
- Réseau collecteur : Excavations de tranchées de câbles L12S3 @ BJ127, BJ127 @ BJ148
  Installation de câbles: L12S3 @ BJ127, BJ127 @ BJ148
  Remblai de tranchées de câbles : FOR 3 @ FOR 2 / Traverse aérienne, L12S3 @ BJ127, BJ127 @ BJ148
  Autre : Sous-Station et O&M

Règles de sécurité :

- Respecter les limites de vitesse en tout temps.
- Prêter attention aux zones où du travail est en cours.
- Garder une distance de sécurité avec les équipements.
- Respecter la signalisation et les agents présents sur le site.
- Ne pas se déplacer dans une zone de travail sans avertir au préalable le contremaître.
- Avoir un contact bidirectionnel positif avec les opérateurs des équipements.

Procédure de dynamitage :


- Signal sonore : 12 petits coups d'avertisseur à une seconde d'intervalle
- Pause de 30 secondes
- Mise à feu
- 1 grand coup de 15 secondes d'avertisseur
- Confirmation par le boutefeu que le sautage a été initié
- Libération du périmètre d'exclusion (zone de tir)

Contact :

- CA-quebeceolien@edf-re.com

borea

HAUTE-CHAUDIÈRE
parc éolien

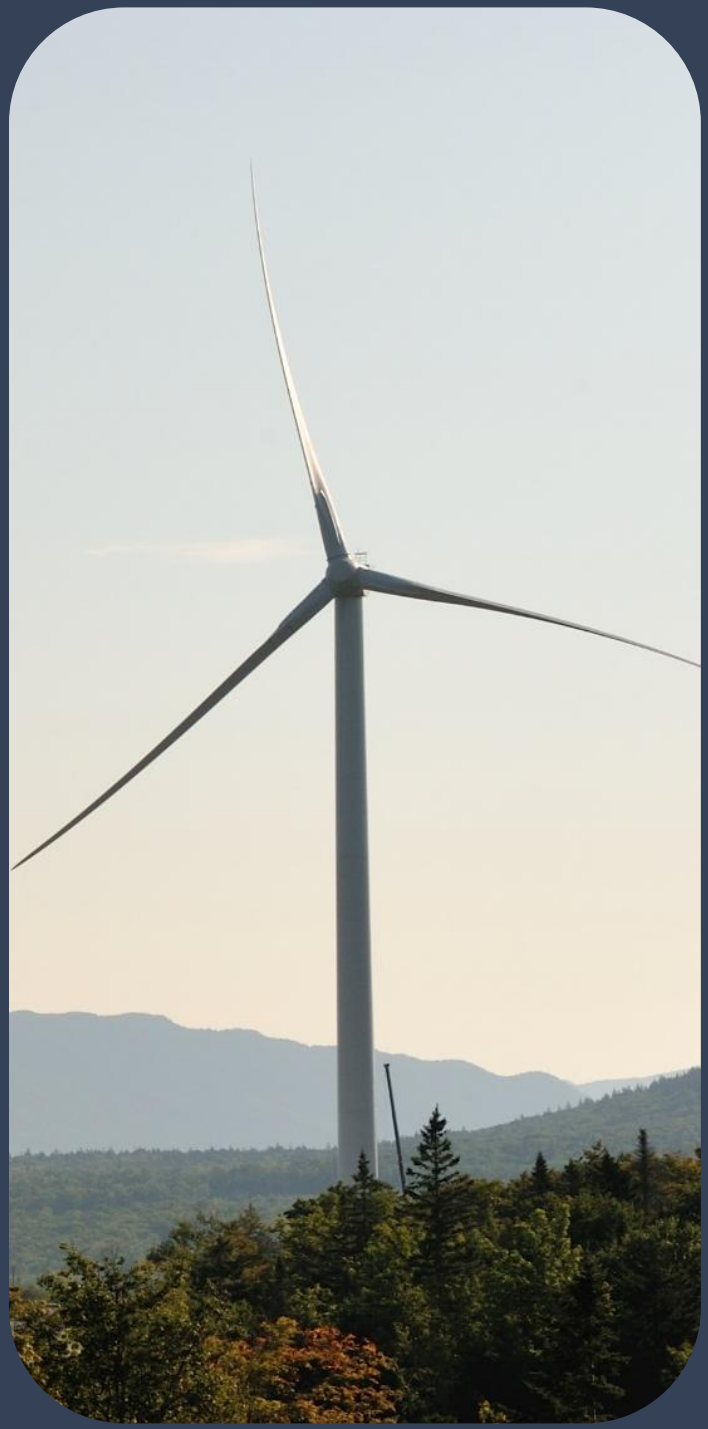

AUDET

Poste électrique
3757 rue Pie Xi, Lac-Mégantic

Rue J.-M.-Tardif

LAC-MÉGANTIC

204

FRONTENAC

Aire de stockage composants

Accès au site

Intersection entre 4e rang et chemin du Mont Round Top, Frontenac

Aire roulotte
Stationnement

Usine à béton

Tour météo 2

Tour météo 1

T1
T3
T6
T7
T9
T11
T12
T13
T15
T17
T18
T22
T23
T24
T25
T26
T27
T28
T29
T30

Boundary Brook

Clear Pond

Mud Pond

Étang du Castor

161

Rte 161

LOWELLTOWN

borea

HAUTE-CHAUDIÈRE
parc éolien

PROJET HAUTE-CHAUDIÈRE

LÉGENDE

- Turbine
- Réseau Collecteur
- Chemin d'accès
- Déboisement
- Dynamitage
- Terrassement
- Fondations
- Réseau Collecteur
- Montage
- Autres

Date : 10/8/2026 | Préparé par : SB

Ref. : HCH_Info-Travaux | Rev. : 01
